ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Délka
1	Pernarec - kanalizace a ČOV	215,88 dny?	5.12. 16	29.9. 17	
2	Gravitační stoky	215,88 dny?	5.12. 16	29.9. 17	
3	Stoka A	154,88 dny	5.12. 16	6.7. 17	
4	výkop	154,88 dny	5.12. 16	6.7. 17	1105
5	Stoka ,,A,,Š19 - Š30	79,88 dny	5.12. 16	24.3. 17	481
6	Stoka ,, A ,, Š30 - Š32	7 dny	27.3. 17	7.4. 17	60
7	Stoka ,, A ,, Š15 - Š5	57,88 dny	4.4. 17	21.6. 17	347,5
8	Stoka ,, A ,, Š15 - Š18	10,88 dny	22.6. 17	6.7. 17	216,5
9	Stoka ,, A ,, protlak	28,88 dny	10.4. 17	18.5. 17	40
10	Stoka G	11,88 dny	22.6. 17	7.7. 17	68
11	Stoka D	34,88 dny	10.7. 17	25.8. 17	342
12	Stoka D1	23,88 dny	10.8. 17	12.9. 17	248,5
13	Stoka D3	9,88 dny	28.8. 17	8.9. 17	22
14	Stoka F	7 dny	8.9. 17	19.9. 17	25
15	Stoka A1	24,88 dny	10.4. 17	12.5. 17	274
16	Stoka B	20,88 dny	22.2. 17	22.3. 17	72
17	Stoka C	23 dny	7.7. 17	9.8. 17	236
18	Stoka D2	7 dny	13.9. 17	22.9. 17	48
19	Stoka E	12,88 dny	8.9. 17	27.9. 17	66,5
20	Stoka S	9,88 dny	4.6. 17	15.6. 17	39
21	Stoka Č	),88 dny?	4.9. 17	29.9. 17	

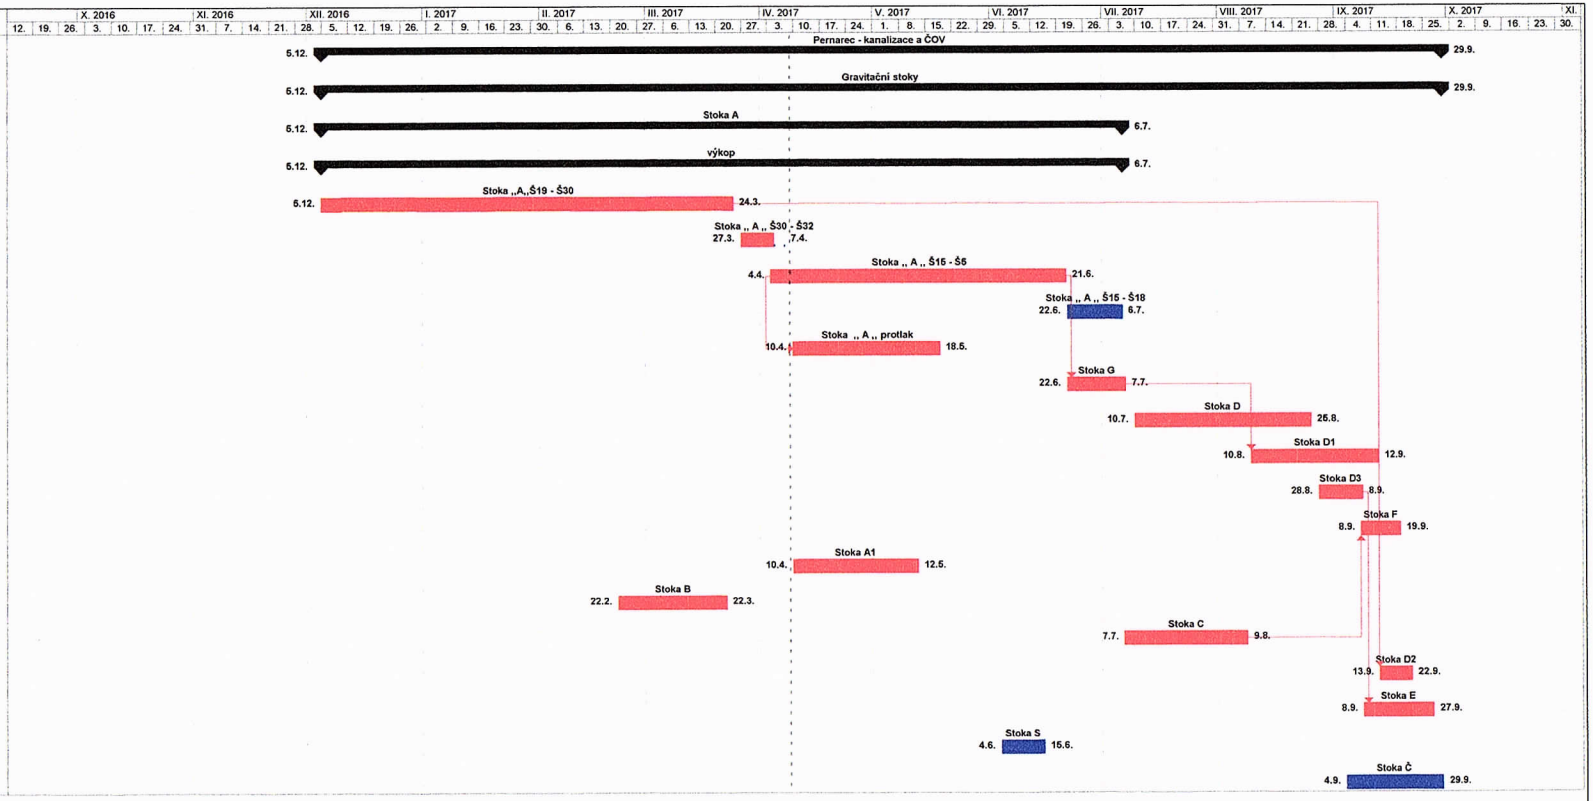

Úkol | Rozdělení | Průběh | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín
